ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Navn på ressurser
1							
2		**Grave/ plastring**	**26 dager**	**ti 27.08.24**	**ti 01.10.24**		
3		Hente blokker	1 dag	ti 27.08.24	ti 27.08.24		
4		Stable blokker/ mur ovenfor Nordre Vange	3 dager	on 28.08.24	fr 30.08.24	3	
5		Stable Vertiblokk nedstrøms søndre vange	3 dager	ti 03.09.24	to 05.09.24	13	
6		Plastring oppstrøms søndre vange og i bekk	3 dager	to 19.09.24	ma 23.09.24	21SS	
7		Fylling mot konstruksjoner	4 dager	fr 20.09.24	on 25.09.24	17SS+4 dager	
8		Bære forstrekningslag mot bru	2 dager	fr 27.09.24	ma 30.09.24	25AS+1 dag	
9		Rekkverksarbeider	2 dager	ma 30.09.24	ti 01.10.24	8SS+1 dag	
10		**Betong arbeider**	**21 dager**	**on 28.08.24**	**on 25.09.24**		
11		Forskaling av fundament for landk	2 dager	on 28.08.24	to 29.08.24		
12		Støp av fundament for landkar	1 dag	fr 30.08.24	fr 30.08.24	11	
13		Demontering av forskaling for fundament for landkar	1 dag	ma 02.09.24	ma 02.09.24	12	
14		Forskaling av landkar og dekke	8 dager	ti 03.09.24	to 12.09.24	13	
15		Armering av lankar og dekke	4 dager	to 05.09.24	ti 10.09.24	14AS-6 dager	
16		Støp av landkar og dekke	1 dag	fr 13.09.24	fr 13.09.24	14	
17		Demontering av forskaling	4 dager	ma 16.09.24	to 19.09.24	16	
18		Forskaling av Vanger på bru	1 dag	ma 16.09.24	ma 16.09.24	16	
19		armering av vanger på bru	1 dag	ti 17.09.24	ti 17.09.24	18	
20		Støp av vanger på bru	1 dag	on 18.09.24	on 18.09.24	19	
21		Demontering av forskaling	1 dag	to 19.09.24	to 19.09.24	20	
22		Forskaling av avlastningsplater	1 dag	fr 20.09.24	fr 20.09.24	21	
23		Armering av avlastningsplater	1 dag	ma 23.09.24	ma 23.09.24	22	
24		Støp av avlastningsplater	1 dag	ti 24.09.24	ti 24.09.24	23	
25		Demontering av forskaling	1 dag	on 25.09.24	on 25.09.24	24	
26		**Åpning av bru**	0 dager	ti 01.10.24	ti 01.10.24	9	

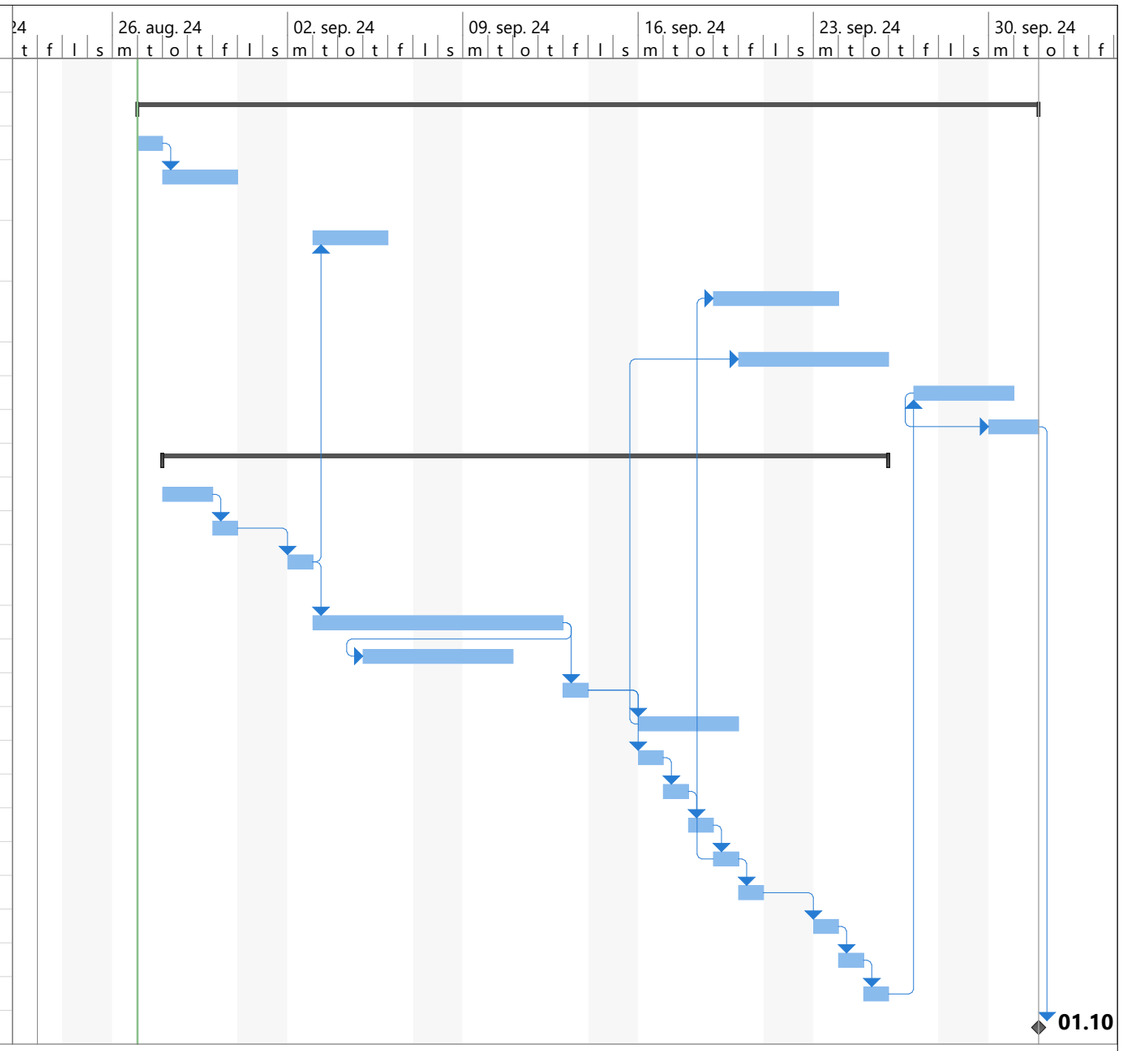

Prosjekt: REV 1 Fremdrift
Dato: ti 27.08.24

Aktivitet	Inaktiv aktivitet	Manuell sammendragsfremheving	Ekstern milepæl		
Deling	Inaktiv milepæl	Manuelt sammendrag	Tidsfrist		
Milepæl	Inaktivt sammendrag	Bare start	Fremdrift		
Sammendrag	Manuell aktivitet	Bare slutt	Manuell fremdrift		
Prosjektsammendrag	Bare varighet	Eksterne aktiviteter			
